Lumina Odonto — Sprint 08: consolidação parcial e planejamento de conclusão

Data de elaboração: 02/11/2026. **Destinatários:** Paulo Sérgio e Cassiano Augusto, para a documentação cumulativa. **Natureza:** capítulo técnico parcial, sujeito à revisão da equipe; não é aceite acadêmico nem relatório de execução de testes desta elaboração.

Projeto: Lumina Odonto. **Grupo:** número não localizado nas fontes examinadas; Paulo/Cassiano devem confirmá-lo antes do PDF oficial. **Integrantes conforme [README do projeto](../../../../README.md):** Caio Cesar; Cassiano Augusto Brito de Souza; João Vitor Lima Rocha; Luiz Otávio de Souza Azevedo; Paulo Sérgio Barros de Souza; Tarcísio Alves Viana Costa Filho. A minuta geral das Sprints 1–6 disponível fora do repositório omite Caio na capa; sua identificação exige revisão.

Marco informado para a Sprint 08: 31/10/2026. O enunciado oficial e o início formal do período ainda não foram fornecidos; o confronto com as exigências abaixo é **provisório**, baseado nas quatro categorias informadas por Paulo: funcionalidades integradas, permissões, usabilidade e revisão das regras. As evidências técnicas de 23–28/10 servem de base anterior; o QA é de 31/10; a especificação funcional v0.4 e as cinco imagens recebidas são de 02/11, **após o prazo informado**. A data exata de cada correção local posterior ao QA não foi comprovada por commit.

Versão examinada: /home/paulinho/Work/Projeto_clinica, branch chore/sprint-07-docker-integration, HEAD 2f7dbfe6d0d7a747f57dbeeede3a716938adc5fa (28/10), com alterações locais sem commit em backend, SQL, testes e documentação. O rastreador local origin/chore/sprint-07-docker-integration aponta ao mesmo hash; isso **não confirma** o estado remoto em 02/11. O PR #16 foi identificado como aberto e com esse HEAD no início do QA de 31/10, segundo o relatório de QA; seu estado atual não foi reconfirmado nesta elaboração.

1. Resumo da situação

O objetivo informado da Sprint 08 era entregar funcionalidades integradas, revisar permissões e regras e melhorar a usabilidade até 31/10. A branch já reunia, de ciclos anteriores, frontend clínico, API de Agenda/prontuário, evidências de confirmação e realização e Compose com PostgreSQL. O QA de 31/10, executado na base 2f7dbfe, comprovou vários caminhos HTTP e de persistência em ambiente descartável, mas encontrou defeitos de concorrência, incompatibilidade entre cliente e API e entregas de painel/relatório/histórico ainda sem demonstração. **O executor foi o agente de QA, não João Vitor.**

Paulo conduziu correções locais de backend para QA-01 e QA-02 após o ensaio; o código agora contém bloqueio e reconferência da autorização, além de controle de versão do rascunho. Os testes posteriores de SQLite, PostgreSQL e da migração foram **informados pelo backend** nos repasses recebidos. Não existe revalidação independente do QA para essa árvore local; Paulo a previu para a próxima sprint, sem atribuir compromisso confirmado a outro integrante.

Em 02/11, a equipe refinou documentalmente o fluxo completo de atendimento e as interfaces necessárias. A especificação funcional v0.4 organiza segunda senha clínica, evolução antes da conclusão, serviços, pagamento externo e correção administrativa. Trata-se de **planejamento de conclusão posterior ao prazo**, com novas operações ainda não comprovadas em execução. Os fluxogramas JPG recebidos são v0.2 e servem apenas de memória do desenho; o fluxo 5 contradiz expressamente a v0.4.

Situação geral: base integrada e fluxos clínicos delimitados demonstrados em 2f7dbfe; correções críticas de backend presentes apenas localmente e testadas segundo o backend; frontend e fluxo composto de atendimento incompletos; aceite integral da Sprint 08 não comprovado.

2. Entregas práticas e limites da evidência

Entrega	Versão e fonte	Situação comprovável	Limite
Inicialização da API e Docker com PostgreSQL	ab129d7 e 9b26c81; registro de integração; QA 2f7dbfe	API, frontend servido e PostgreSQL 16.15 funcionaram em ambiente descartável do QA; persistência foi verificada após reinício e recriação sem remover o volume de teste.	Não demonstra a árvore local posterior nem migração, backup/restauração ou funcionamento do banco existente da equipe.
Agenda, confirmação, conclusão e evidências	be7c2f2, ac180a7, ef15a63; relatório QA; serviço	HTTP e SQL da base 2f7dbfe demonstraram confirmação autorizada e conclusão pelo dentista responsável após CONFIRMED, com horário informado e evidências persistidas.	A interface ainda envia somente {status} para concluir e não fornece care_occurred_at com fuso; QA-03 permanece. A conclusão atual não exige evolução salva nem itens/Sem cobrança.
Prontuário e evoluções	b224faa, 34b128f e correções posteriores; API; QA 2f7dbfe	QA verificou leitura por dentista elegível, isolamento por clínica, rascunho próprio, finalizadas compartilhadas, finalização explícita e recuperação após reinício no ambiente de teste.	O GET /record atual pode abrir o prontuário; D02 continua aberta. A segunda senha e o fluxo administrativo não estão implementados.
QA-01 e QA-02	Diferenças locais em access_repository.py, models.py, schemas.py, service.py, schema.sql, testes e migração de 31/10; fechamento parcial anterior	Código local inspecionado contém as duas correções; o backend informou testes posteriores.	Sem commit, imagem integrada ou revalidação independente. Migração preparada não aplicada ao banco existente.
Contratos HTTP	2f7dbfe; Agenda e records	Guias da API existentes; o guia clínico local descreve version.	O README local da Agenda ainda contém a afirmação histórica de que QA-02 não tem controle de versão; precisa ser alinhado ao código local antes de publicação.
Dashboard, filtros e pesquisa	frontend, plano da Sprint 7 e QA	Dashboard existia desde a Sprint 4; busca local de pacientes e filtros HTTP da Agenda foram encontrados.	Indicadores novos de consultas por situação/período não foram demonstrados; três verificações visuais em navegador não foram executadas.

O dashboard **não foi criado nesta sprint**: o primeiro commit comprovado nesta linha local é e3d9393 (25/09, Sprint 4), inicialmente com números de demonstração; d806382 (26/09) integrou contagem de pacientes da API, perfil e equipe. A minuta geral até a Sprint 6 o apresenta na Sprint 4 (Figura 29, página física 74), conforme análise anterior. Essa existência não atende aos novos indicadores de consultas.

3. QA de 31/10, defeitos e correções posteriores

A matriz CSV contém **209 verificações: 197 aprovadas, 8 reprovadas, 1 bloqueada e 3 não executadas em navegador**. As linhas reprovadas incluem sondagens distintas dos defeitos agrupados abaixo; não se deve confundir oito linhas com oito IDs. O ensaio usou dados fictícios e PostgreSQL 16.15 descartável. O QA não executou clique visual em navegador e não testou as correções posteriores.

Achado na base 2f7dbfe	Reprodução e impacto resumidos	Situação posterior
QA-01 — escrita após perder a última autorização	Mutação clínica esperou bloqueio da evolução; a última confirmação foi cancelada; edição/finalização ainda retornaram 200, embora leitura posterior fosse 403. Risco de alterar registro sem vínculo vigente.	Código local bloqueia consultas de origem e reconfere autorização após a espera, até commit/rollback; backend informou ensaios PostgreSQL. **Revalidação independente pendente.**
QA-02 — sobrescrita silenciosa	Duas edições do mesmo rascunho retornaram 200/200, com perda do primeiro texto.	Código local exige version inteiro positivo no PATCH; edição aceita incrementa, versão antiga recebe 409, ausência ou valor inválido recebe 422; finalização sem corpo incrementa a versão. **Revalidação independente pendente.**
QA-03 — cliente não conclui conforme contrato	frontend/src/api.ts envia só {status}; API exige care_occurred_at com fuso e respondeu 422 para esse corpo.	Sem ajuste do frontend identificado. Falha de contrato, sem clique visual de QA.
QA-04 — limite de login	Com configuração de 100/minuto, sexta tentativa fictícia recebeu 429; código fixa cinco.	Sem correção local identificada.
QA-05 — histórico funcional	Após operações no ambiente QA, audit_logs=0 e nenhuma rota de leitura apareceu.	Tabela SQL existente não prova histórico; entrega não demonstrada.
QA-06 — indicadores de consultas	Código e bundle mostraram painel de pacientes/perfil/equipe, sem agregado de consultas por situação e período.	Melhoria não demonstrada; dashboard anterior preservado.
QA-07 — relatório de agendamentos	Sem view correspondente e sem rota identificada no bundle/OpenAPI testado.	Relatório não demonstrado.

O backend informou, para a árvore local posterior, **82 testes SQLite aprovados, 10 pulados exclusivos de PostgreSQL e 10 testes PostgreSQL 16.15 aprovados**, além de ensaio da migração version em banco descartável após ajustar o nome do banco de teste. O primeiro ensaio de migração falhou por essa exigência do ambiente e a repetição passou. Os repasses estão transcritos no relatório de fechamento parcial da Sprint 7; logs finais independentes não foram

anexados aqui. **Esses números não são nova execução deste relatório, não se somam às 209 linhas e não encerram os defeitos perante QA.**

A migração incremental de version está preparada, sem aplicação no banco existente. A versão 1 atribuída a registros antigos é a base do novo protocolo, não contagem retroativa de edições. Consumidores da API precisam guardar/enviar version e tratar 409; o frontend atual ainda não o faz, de modo que sua edição receberá 422 se a API local for ativada após a migração. O escopo do ensaio descartável não demonstra segurança para esquema Alembic, misto ou volume da equipe.

4. Planejamento de conclusão do atendimento — decisões de 02/11

A especificação v0.4 e o roteiro alinham protótipo, API, banco e testes futuros. As decisões de Paulo abaixo são **direção funcional aprovada**, não funcionalidades entregues até 31/10:

1. Paciente participa fora da plataforma; não há portal neste recorte. Dentista usa senha principal e segunda senha clínica **pessoal**, que não substitui vínculo assistencial, perfil ou clínica.
2. Recuperação usa credencial temporária com validade e uso único; administrador não conhece a senha clínica definitiva. Prazo, canal e verificação de identidade continuam pendentes.
3. Para concluir, o dentista deve ter evolução **salva com descrição**, mesmo que permaneça DRAFT. Finalizar evolução e concluir consulta são ações distintas; não há finalização automática.
4. O dentista informa itens administrativos com nome, quantidade e preço ou declara explicitamente **Sem cobrança**. Lista vazia não é declaração de gratuidade. A operação conjunta de conclusão, realização e encaminhamento é **recomendação técnica** ainda sem implementação demonstrada.
5. Pagamento ocorre fora do sistema. A recepção confirma o recebimento e o registro identifica responsável e instante. Concluir a consulta não registra pagamento. A v0.4 **não exige novos campos de valor recebido ou forma de pagamento**.
6. Paulo indicou administrador para correção de serviços. Bloqueio após pagamento, motivo, histórico e versionamento do encaminhamento são **limites técnicos propostos**, ainda sujeitos a decisão; essa correção não altera evolução clínica.
7. Paralelismo de Argon2 é **somente sugestão para avaliar** a possibilidade acadêmica; não há mudança, benchmark ou ganho comprovado.

O contrato futuro deve separar respostas clínicas de dados administrativos acessíveis à recepção; prever falha, concorrência, reenvio sem duplicidade, confirmação perdida e rastreabilidade. Nada disso substitui a implementação e os testes em versão identificada.

4.1 Inventário e leitura das cinco imagens recebidas

As cópias preservam os arquivos JPG recebidos em 02/11, sem redesenho. **Todas trazem “Versão 0.2” na própria imagem.** Suas figuras representam **funcionamento planejado**, nunca execução do sistema. A coluna de ressalvas governa a leitura em relação à v0.4; em caso de conflito, vale a especificação textual v0.4.

Figura recebida	Correspondência	Coerência e ressalva
Figura 1 — Fluxo 1.jpg	Atendimento e encaminhamento	Mostra evolução, itens/Sem cobrança e conclusão distinta de pagamento, mas é v0.2, tem setas e decisões de validação ambíguas e não comprova transação implementada.
Figura 2 — Fluxo 2.jpg	Desbloqueio, autorização e falhas	Traz senha clínica, reavaliação de origem e resposta perdida como plano; contém verificações repetidas e contratos futuros sem definição. Não comprova segunda senha existente.
Figura 3 — Fluxo 3.jpg	Evolução e conflitos	Representa conflito de versão e finalização separada, mas repete etapas e mistura classificação de código local e proposta. O version local continua sem QA independente.
Figura 4 — Fluxo 4.jpg	Recuperação da senha clínica	Inclui credencial temporária, uso único e senha definitiva invisível ao administrador; apresenta caixas duplicadas de emissão e depende de canal e prazo ainda indefinidos.
Figura 5 — `Fluxo 5.jpg`	Pagamento	**Desatualizada e incompatível com a v0.4:** pede valor recebido e forma, valida política de valores e sugere registro financeiro mais amplo. A v0.4 aprovou confirmação simples do recebimento externo, com ator e instante, sem esses novos campos. Não usar esta figura como regra atual.

Fluxo 6 — correção administrativa de serviços: não houve imagem recebida. Paulo orientou utilizar apenas as cinco imagens acima; a direção aprovada e os limites propostos são descritos em texto a partir do complemento v0.4, sem gerar ou substituir a figura ausente.

5. Permissões, usabilidade e regras

Controle encontrado e ensaiado em `2f7dbfe`: API restringe conteúdo clínico a dentista ativo com cadastro profissional, mesma clínica e origem assistencial válida; rascunhos são privados ao autor e finalizadas são compartilhadas com dentistas elegíveis. A Agenda separa confirmação/cancelamento/ausência autorizadas da conclusão pelo dentista responsável, após confirmação confiável. O QA cobriu perfis, duas clínicas e fundamentos de acesso, mas revelou QA-01 sob concorrência. **Controle local posterior:** bloqueio das origens e reconferência após espera; ainda requer revalidação independente. **Propostas novas:** segunda senha clínica, recuperação, recorte administrativo para recepção e correção de serviços pelo administrador. A senha clínica jamais amplia o conjunto de pacientes autorizados.

Usabilidade existente: frontend possui dashboard, Agenda, filtros e telas clínicas herdadas; a pesquisa local de pacientes foi encontrada. O QA não executou navegação visual em navegador. O protótipo proposto organiza consultas próprias, prontuário, evolução, serviços, consultas realizadas e confirmação de recebimento pela recepção, distinguindo salvar, finalizar, concluir e pagar. Estados de carregamento, conflito, expiração e falha são **orientações de desenho**, não melhorias validadas por usuários. QA-03 e a ausência de version no cliente impedem tratar o fluxo atual como integrado.

Regras e IDs existentes: RF-022 e RN-024/RN-025 tratam estados e conclusão da Agenda; RF-023/RN-031 tratam preparação por confirmação ativa, continuidade por realização comprovada e leitura clínica; RF-024/RN-032 tratam evoluções, autoria, privacidade e preservação. RF-025/RN-033 continuam proposta de IA. A decisão de 02/11 acrescenta pré-requisito de evolução salva e itens/Sem cobrança ao fluxo pretendido, com impacto em frontend, contrato da API e modelagem/persistência administrativa. Os catálogos e índices locais ainda contêm trechos datados de 25/10 que chamam parte da política já codificada em 26/10 de “implementação pendente”; precisam de reconciliação documental própria antes de citação como fotografia atual. Não se criam IDs novos nem se altera requisito canônico neste relatório.

6. Confronto provisório com as exigências informadas da Sprint 08

Limite: sem o enunciado oficial, esta matriz cobre apenas as quatro categorias e o prazo informados por Paulo. Cassiano deve substituí-la ou completá-la contra o texto acadêmico antes da entrega oficial. Planejamento posterior a 31/10 não substitui prova prática no prazo.

Exigência informada	Entrega e evidência disponível	Situação	Lacuna	Próxima ação proposta
Funcionalidades integradas	Compose/API/Agenda/prontuário no QA 2f7dbfe; 209 verificações; QA-01/02 corrigidos só localmente	**Parcial**	Cliente não conclui pelo contrato; fluxo com evolução prévia, serviços, encaminhamento e pagamento externo não demonstrado; banco existente não migrado	Alinhar contratos e cliente, implementar recorte aprovado e repetir testes em versão integrada identificada.
Permissões	QA de perfis, clínica, vínculo e autoria; RN-031; QA-01 detectado; correção local	**Parcial**	Revalidação independente de QA-01 pendente; segunda senha e permissões administrativas futuras ainda sem contrato	Fechar decisões, implementar controles na API e repetir cenários de concorrência e acesso por perfil/clínica.
Usabilidade	Dashboard anterior, Agenda, filtros e telas clínicas; inspeção de código/bundle	**Parcial, sem validação visual**	QA-03, indicadores novos, relatório e três ensaios em navegador pendentes; protótipo v0.4 é planejamento	Ajustar cliente, obter protótipo consistente e registrar demonstração em navegador com dados fictícios.
Revisão das regras de negócio	RF-022/023/024, RN-024/025/031/032 e especificação v0.4	**Revisão documental parcial**	Decisões de 02/11 são posteriores ao prazo; índices antigos divergem do código; regras de quitação/correção ainda abertas	Confirmar enunciado, harmonizar documentos canônicos em etapa autorizada e vincular decisões, código e testes.

7. Dificuldades, prioridades e condições de conclusão

Prioridade	Pendência e motivo	Frente/responsável proposto, sem compromisso individual confirmado	Evidência necessária
1	QA-01/QA-02 locais sem commit, migração no banco existente ou revalidação independente	Paulo/backend, DBA e QA	Commit identificado, migração autorizada em destino inventariado e ensaios independentes PostgreSQL com estado persistido.
2	Cliente incompatível com care_occurred_at e version	Frontend (Caio/Otávio) com backend	Payloads, tratamento 409/422, demonstração em navegador e QA na mesma versão.
3	Contratos e dados novos da v0.4 ainda sem implementação	Paulo para decisões, frontend, backend e banco	Protótipo revisado, contrato administrativo separado, migração e cenário ponta a ponta testado.
4	QA-04/05/06/07, exportação bloqueada por decisão e três cenários visuais não executados	Equipe por área; QA reexecuta após correção	Evidência de limite de login, histórico, indicadores, relatório e decisão/justificativa de CSV; capturas fictícias.
5	Numeração do grupo, enunciado Sprint 08 e cumulativo final	Paulo e Cassiano	Enunciado, número do grupo, arquivo geral editável, seções anteriores revisadas, figuras/referências e comprovante de entrega.

Paulo informou que a revalidação independente de QA-01/QA-02 fica **prevista para a próxima sprint**. Não há prazo individual novo, aceite coletivo, aprovação da disciplina ou garantia de disponibilidade atribuída neste capítulo. O fluxo planejado deve ser reavaliado com o enunciado acadêmico; mudança de planejamento não dispensa exigência sem aprovação expressa.

8. Fontes e método

Fontes principais: relatório de QA e matriz; fechamento parcial da Sprint 7; plano da Sprint 7; especificação funcional v0.4, roteiro, complemento, parecer backend, parecer frontend e parecer QA; README da equipe; RF/RN e código ligados acima; histórico Git local; cinco JPGs fornecidos por Paulo. A minuta geral até a Sprint 6 foi consultada apenas para identificação e contexto histórico, sem declarar que represente o PDF final.


Esta elaboração fez **leitura documental e estática**, conferiu o CSV e as imagens e produziu o presente relatório. Não executou testes, build, navegador, contêineres, banco ou migração. Não confirmou o remoto atual, não publicou e não obteve aceite de Paulo, da equipe, de QA ou da disciplina.

Anexo visual — imagens históricas fornecidas

Aviso para todas as figuras: JPGs originais v0.2, fornecidos em 02/11/2026; representam hipóteses e propostas de fluxo, não software executado. A v0.4 prevalece em caso de divergência. A numeração abaixo pertence somente a este capítulo e deve ser ajustada por Cassiano ao inserir as figuras no PDF cumulativo.

Figura S08-1 — Fluxo 1: atendimento e encaminhamento (v0.2; planejamento histórico). Ver item 4.1; conclusão e encaminhamento compostos ainda não demonstrados.

FIGURA HISTÓRICA v0.2 — planejamento, sem prova de execução. A especificação v0.4 prevalece em caso de divergência.

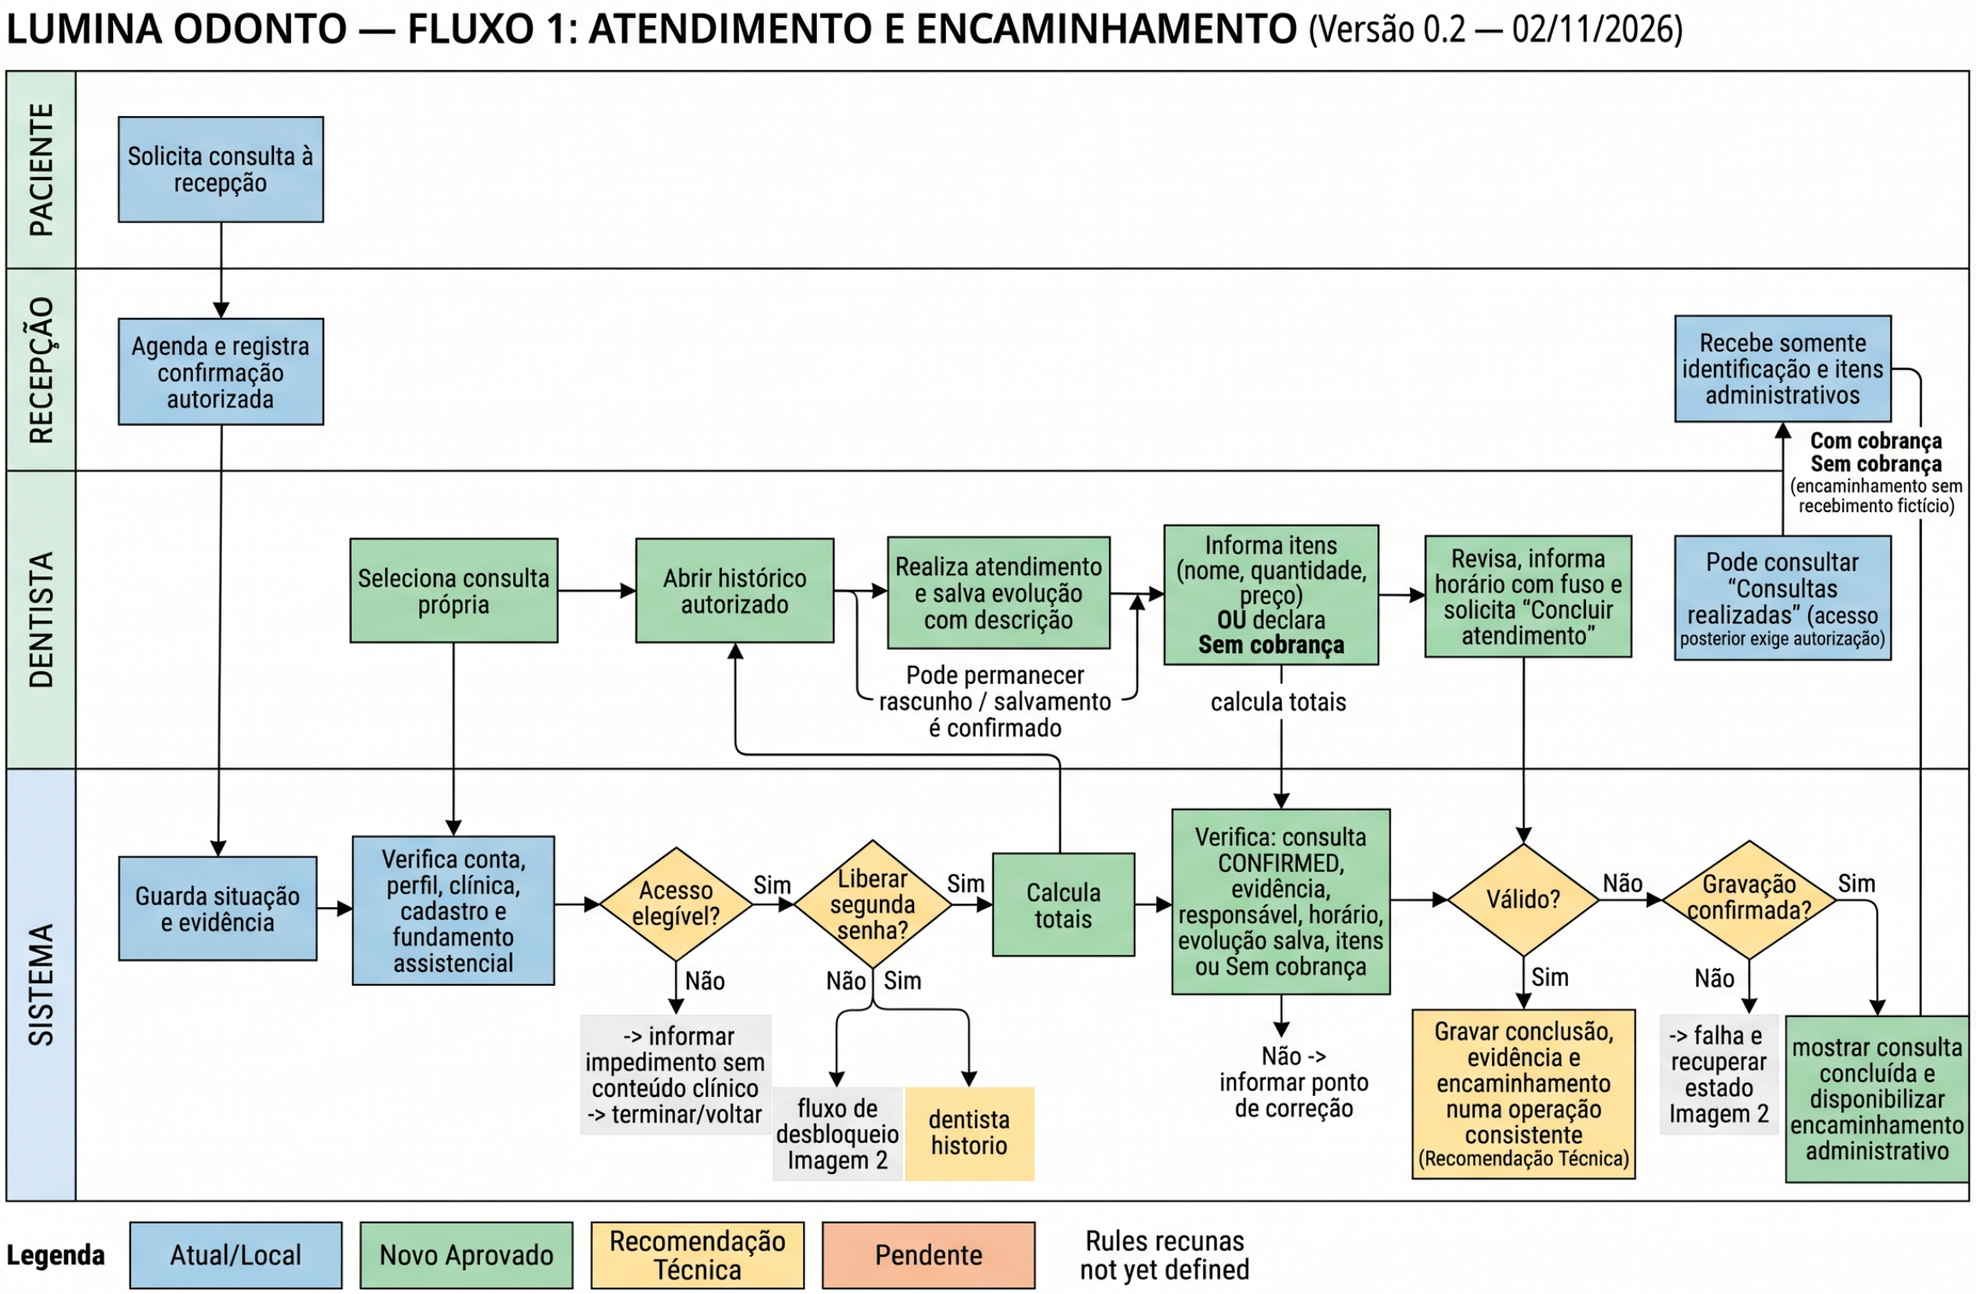

Notas ao lado


- Salvar/finalizar evolução não conclui consulta. Concluir não finaliza evolução nem registra pagamento.
- Evolução salva antes continua salva se a conclusão posterior essa etapa é nova.
- Evolução salva antes continua salva se a conclusão posterior falhar; não há rollback do atendimento.
- Contrato atual de conclusão ainda não cria encaminhamento; essa etapa é nova.

...

- Não transformar Sem cobrança em pagamento recebido zero ou terceiro estado financeiro.

Figura S08-2 — Fluxo 2: desbloqueio clínico, autorização e falhas (v0.2; planejamento histórico). Segunda senha e recuperação ainda não implementadas.


FIGURA HISTÓRICA v0.2 — planejamento, sem prova de execução. A especificação v0.4 prevalece em caso de divergência.

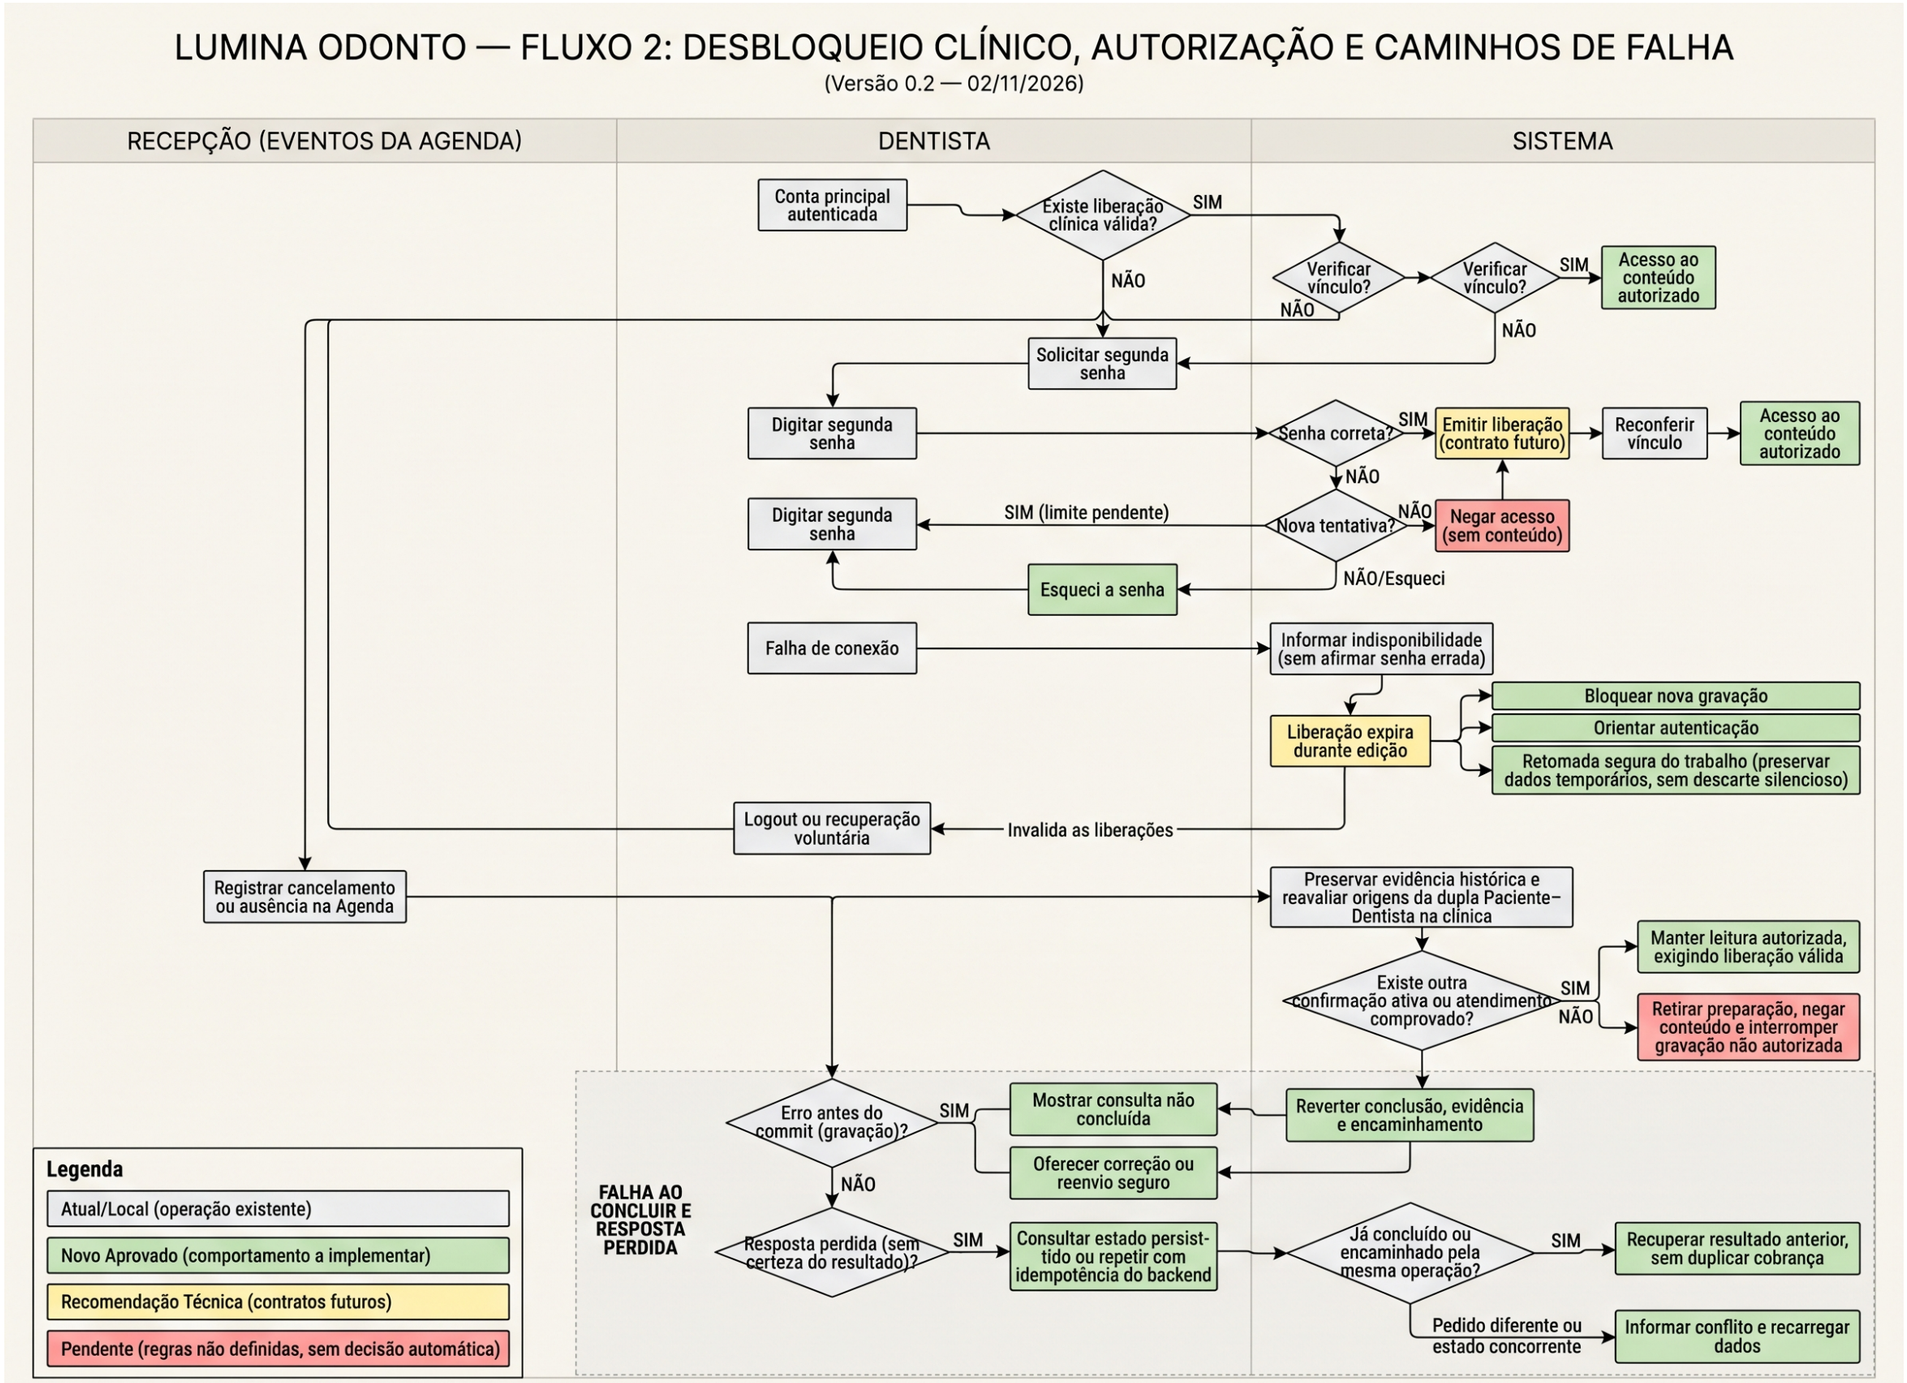

fluxograma-02-desbloqueio.png

Figura S08-3 — Fluxo 3: evolução e conflitos (v0.2; planejamento histórico). A correção local de `version` aguarda QA independente.

FIGURA HISTÓRICA v0.2 — planejamento, sem prova de execução. A especificação v0.4 prevalece em caso de divergência.

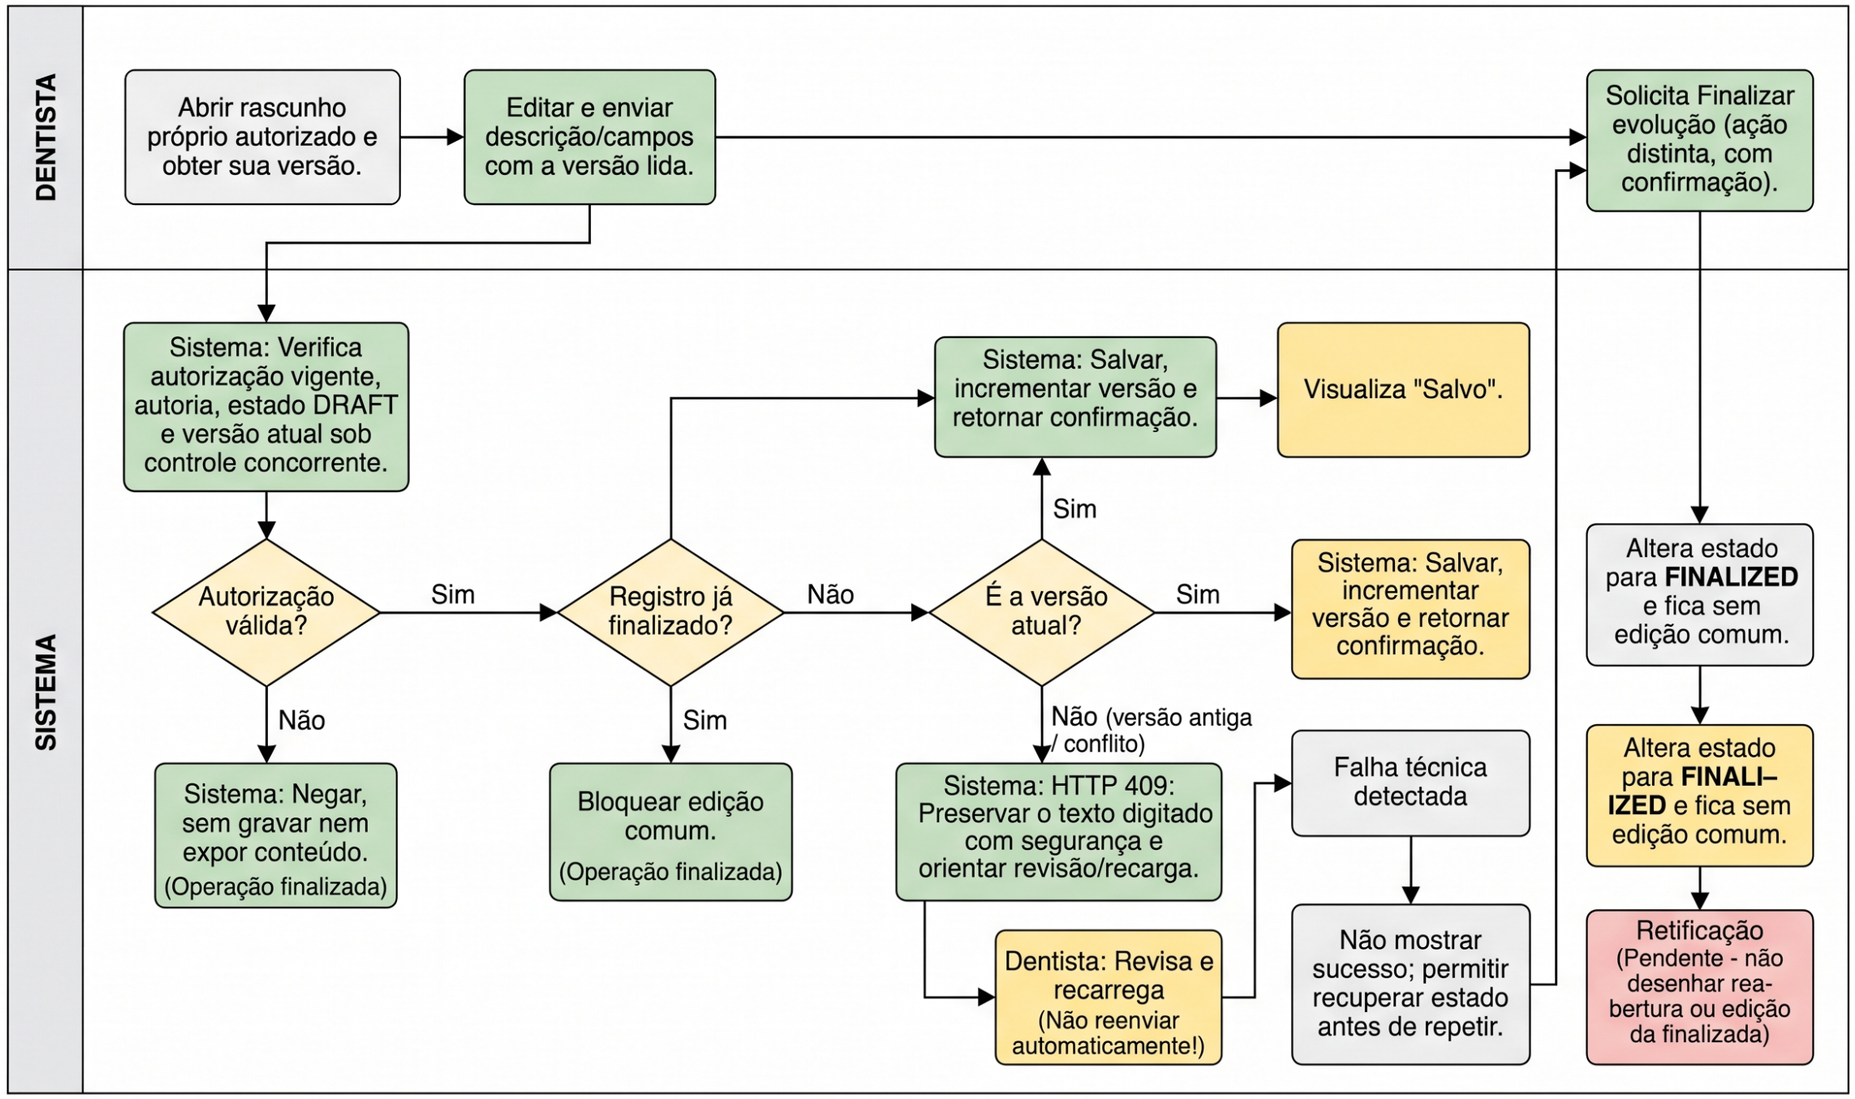


Atual/Local (operação existente)
Novo Aprovado (comportamento a implementar)
Recomendação Técnica (contratos futuros)
Pendente (regra não definida, sem decisão automática)

Nota: obrigatoriedade de evolução salva antes de concluir não significa finalizar automaticamente. O número da versão é detalhe do contrato; não ximar nas restaos do contrato; não exigir que o usuário o digite.

Figura S08-4 — Fluxo 4: recuperação da senha clínica (v0.2; planejamento histórico). Canal, prazo e verificação de identidade estão abertos.

FIGURA HISTÓRICA v0.2 — planejamento, sem prova de execução. A especificação v0.4 prevalece em caso de divergência.

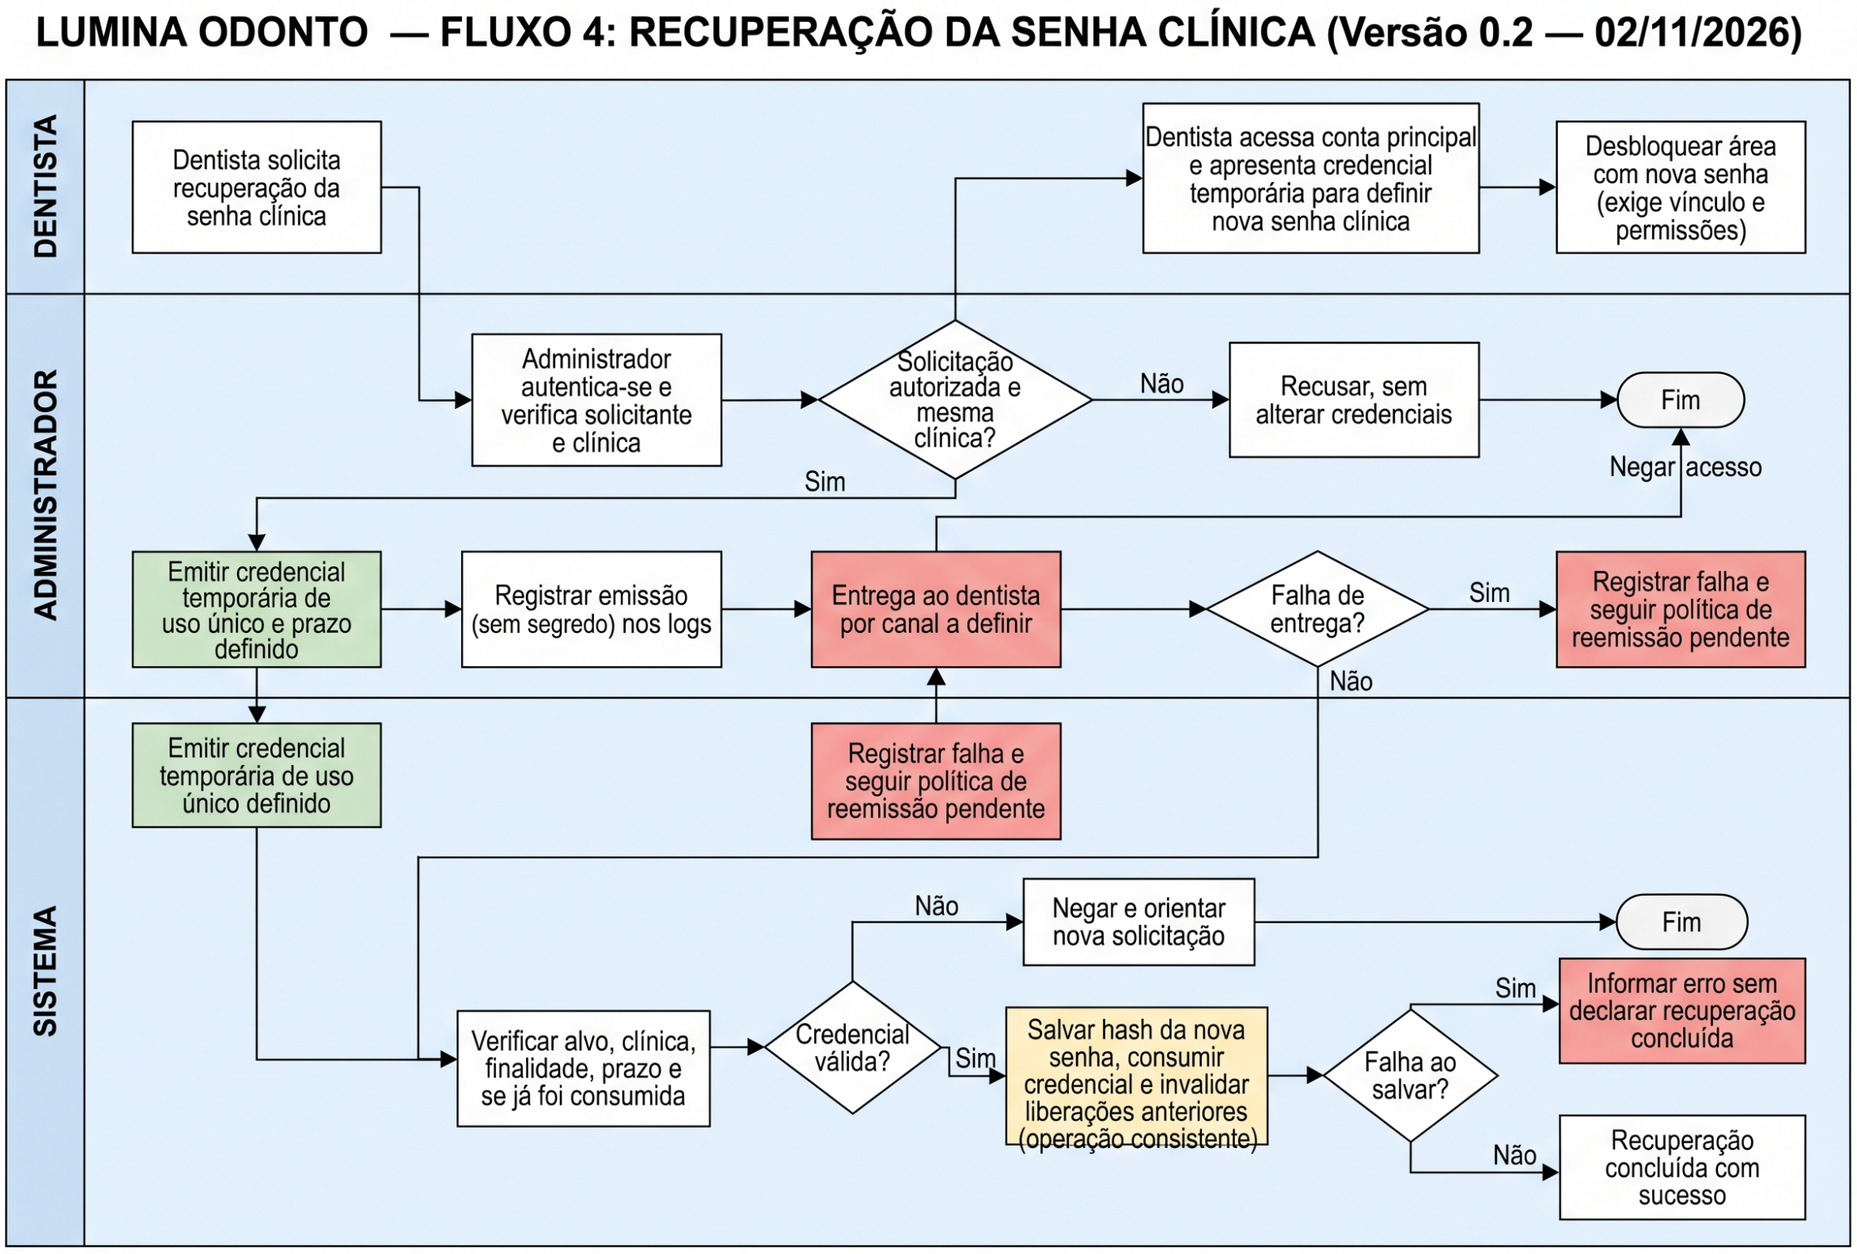

Legenda:

Atual/Local (operação existente)	Novo Aprovado (comportamento a implementar)	Pendente (regras não definidas, sem decisão automática)

Notas:

Nota: O administrador não conhece a senha definitiva.
Nota: Credencial temporária tem uso único e validade; não abre o prontuário diretamente.
Nota: Duas tentativas simultâneas com a mesma credencial são bloqueadas.

Figura S08-5 — Fluxo 5: pagamento (v0.2; DESATUALIZADO). A figura pede valor recebido e forma; não utilizar esse trecho como regra da v0.4, que prevê somente confirmação do recebimento externo com responsável e instante, sem novos campos de valor e forma.

FIGURA 5 DESATUALIZADA — não usar valor recebido e forma de pagamento como campos novos da v0.4. Pagamento externo é confirmado pela recepção.

